

LIFE SPRINGDAY, Nõrglubjaallikate (elupaigatüüp *7220) kaitse ning taastamine Eesti Natura 2000 võrgustiku aladel

LIFE12 NAT/EE/000860

Juhtkomitee koosoleku protokoll nr 7

Juhtkomitee liikmetele esitati kirjalik ülevaade projekti hetkeseisust (lisatud). Juhtkomitee võttis informatsiooni teadmiseks ja hindas projekti edenemise vastavaks eesmärkidele ja tööplaanile. Järgmine koosolek toimub 2017. aasta II kvartalis Viidumäel. Kokkusaamise aeg täpsustatakse kuu enne koosoleku toimumist.

Protokolli koostas:

Mart Thalfeldt

03. jaanuar 2017. a.



LIFE SPRINGDAY, Nõrglubjaallikate (elupaigatüüp *7220) kaitse ning taastamine Eesti Natura 2000 võrgustiku aladel (LIFE12 NAT/EE/000860)

Ülevaade projektist ajavahemikul juuni – detsember 2016

Käesolevaga antakse ülevaade käimasolevatest tegevustest. Juba lõpetatud või veel mitte alustatud tegevusi aruanne ei kajasta.

Projekt on edenenud plaanipäraselt. Projekti eesmärkides ega lõpptähtaegades muudatusi ei ole tehtud.

Tegevused


1. C-tegevused. Konkreetsed tegevused.

Eesmärk: säilitada ja taastada allikasooide ning nõrglubjaallikate elupaikade toitumisrežiimi.

Ettevalmistavad tegevused on lõpetatud ja konkreetsete tööde teostamine käib.

C1 – Kiigumõisa.

Kõrvemaa maastikukaitsealal on puhastatud ligikaudu 3 ha sooelupaikasad kuivendamise mõjul pealekasvanud metsast ja võsast. 2017. aastal on kavas eemaldada võsa lisaks veel 2 hektarilt.

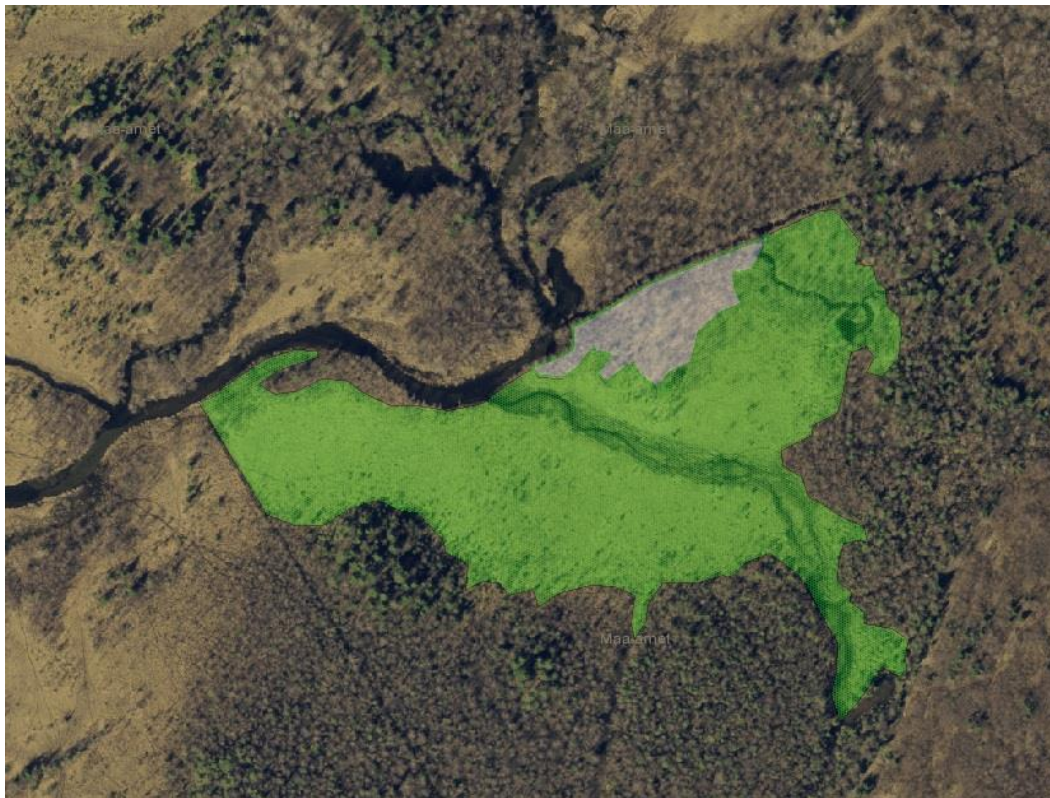

C2 - Viidumäe. Allikate ja allikasooode loodusliku hüdroloogilise režiimi taastamine (kraavide sulgemine ja likvideerimine). Allikasoo õpperaja rekonstrueerimine.

Suuremad tööd hüdroloogilise režiimi taastamiseks on lõpetatud. Kokku sulgeti kas osaliselt või täielikult ligikaudu 3 km kraave, sealhulgas kõige olulisem negatiivse mõjuga kraav pikkusega 1,6 km Suurissoos. RMK raadas nimetatud kraavi mõjualale kasvanud metsa kokku 10 hektarilt, et luua eeldused soolupaikade taastumiseks.




Suletud kraav ja raadatud ala, Viidumäe, oktoober 2016

Väiksemate kraavide sulgemine üksikute puittõketega jätkub.

Ehituslikud tööd Viidumäe allikasoo õpperaja rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks on tehtud. Kokku 1,8 km pikkusel rajal ehitati 340 meetrit laudteed, kaks vaateplatvormi ja infotahvli, trepp ja rajaviitasid. Lääne-Saare vallavalitsus väljastas detsembris raja kasutusloa.



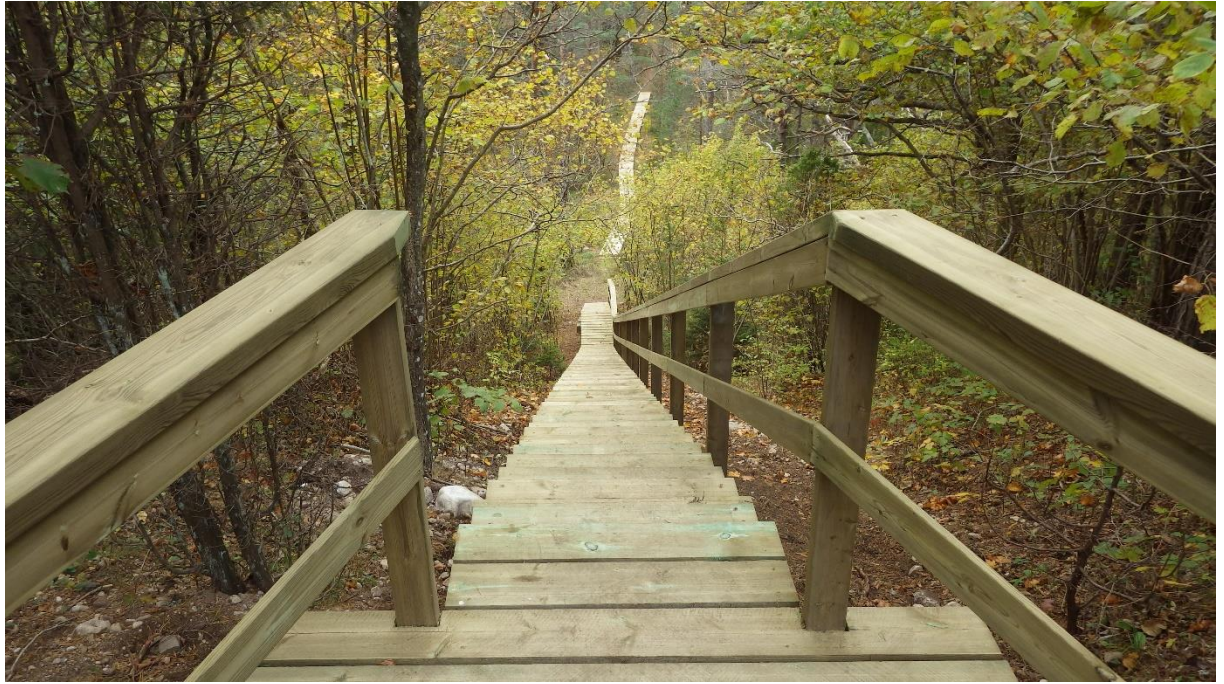

Allikasoo õpperada, september 2016





C3 - Vormsi. Prästvike järve hooldus. Allika matkaraja rekonstrueerimine.

Prästvike järve hoolduse tööd toimusid augustist oktoobrini. Roog ja veetaimestik eemaldati 8,5 hektarilt. 2017. aasta suvel tegevust jätkatakse.





Prästvike järve lõunaosa, oktoober 2016

Allika matkaraja rekonstrueerimise ja laiendamise ehitustööd on alustatud.



Allika matkarada, Suurallikas, detsember 2016





D-tegevused. Tegevuste seire.

Tegevus toimub plaanipäraselt. Hüdroloogiliste andmete kogumine toimub nii automaatsete salvestite abil kui ka käsitsi. Taimestiku seiret teostati Viidumäel kraavide sulgemise mõjualadel.

E-tegevused. Avalikkuse teavitamine.

Projekti tegevusi kajastab Loodushoiu Keskuse koduleht. Projekti on tutvustatud kohalikele elanikele ja omavalitsuste esindajatele.

Viidumäe tegemisi on kirjutatud RMK loodusblogis <https://www.rmkk.ee/metsa-majandamine/loodusblogi/soode-taastamine-viidumael>

F-tegevused. Projekti juhtimine.

Projekti igapäevase tegevuse korraldamiseks vajalik meeskond on komplekteeritud. Üldises tööplaanis muudatusi teha vaja ei ole.

Projekti tutvustamine ja koostöö teiste projektidega käib. Koostöös Keskkonnaministeeriumi ja Keskkonnametiga korraldati boreaalse regiooni madalsoode seminari osalejatele väljasõit projekti Viidumäe alale.

Projekti tutvustati 13.-14. septembril Pärnus korraldatud LIFE Urbancows seminaril ja 20.-23. septembril Krakowis toimunud rahvusvahelisel märgalade taastamise konverentsil



Projekti eelarve täitmine 31. detsember 2016

Budget breakdown categories	Total cost in €	Costs incurred from the start date to 31.12.2016 in €	% of total costs
1. Personnel	374480	208836	55,8
2. Travel and subsistence	44662	30411	68,1
3. External assistance	164537	149505	89,9
4. Durable goods			
Equipment	172933	184582	106,7
6. Consumables	22872	24186	105,7
7. Other Costs	1100	8260	750,9
8. Overheads	54640	30000	50,9
TOTAL	835224	635780	76,1



ACTION PLAN, name of action		2013	2014	2015	2016	2017	2018
Progress reports	Proposed						
	Actual						
A1 Analysis of the existing information	Proposed						
	Actual						
A2 Elaboration of detailed fieldwork plan	Proposed						
	Actual						
A3 Evaluation of the spring habitats and their close surrounding area	Proposed						
	Actual						
A4 Planning detailed conservation measures	Proposed						
	Actual						
A5 Elaboration of monitoring guidelines for petrifying spring habitats	Proposed						
	Actual						
C1 Restoration of petrifying spring habitats in Kõrvemaa Landscape Protection Area	Proposed						
	Actual						
C2 Restoration of petrifying spring habitats in Viidumäe Nature Reserve	Proposed						
	Actual						
C3 Restoration of petrifying spring habitats in Vormsi Landscape PA	Proposed						
	Actual						
D1 Monitoring of project concrete conservation actions	Proposed						
	Actual						
D2 Assessment of the project impact	Proposed						
	Actual						
E1 Project website	Proposed						
	Actual						
E2 Issuing of booklets related to the targeted springs and their surrounding habitats	Proposed						
	Actual						
	Proposed						



